

NIEDERSCHRIFT

über die 40. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am Dienstag, 14. November 2023

BEGINN: 16:00 Uhr

ENDE: 18:55 Uhr

Sitzungsort: Relieffzimmer des Stadtschlusses, Vogteiplatz 8-10, 91567 Herrieden

ANWESEND

Mitglieder

Name	Funktion	Bemerkung zur Anwesenheit
Dorina Jechnerer	Erste Bürgermeisterin	
Johann Heller	Dritter Bürgermeister	
Robert Goth	Stadtrat	
Armin Jechnerer	Stadtrat	
Jürgen Leis	Stadtrat	anwesend bis n.ö. TOP 3.3.
Matthias Rank	Stadtrat	ab TOP 3.
Gaby Rauch	Stadträtin	
Michael Weis	Stadtrat	
Franziska Wurzinger	Stadträtin	

Entschuldigt sind

Stefan Beckenbauer	Stadtrat
--------------------	----------

Schriftführerin

Michaela Bernhard

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung
2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2023
3. Ergebnisse der Verkehrsschau
4. Außenbesichtigung
5. Bekanntgaben
 - 5.1 Sachstandsbericht der Baumaßnahmen
 - 5.2 Zusätzlicher Durchlass Kr AN 37 Sickersdorf
 - 5.3 Vorstellung Bestands-, Schadens- und Sanierungsgutachten Vordere Gasse 13
 - 5.4 Hofzufahrt der Firma Hammerbacher über städtischen Gehweg in Steinbach.

- 6. Bauanträge
- 6.1 Tekturplan für Errichtung eines Erdwalls
- 6.2 Einbau Bühne bei Halle 8.0
- 6.3 Antrag auf Vorbescheid für die Neuerrichtung eines FFW-Hauses OT Hohenberg
- 7. Antworten zu den eingereichten Bürgeranfragen
- 8. Anfragen
- 8.1 Gaby Rauch: Geschwindigkeitskontrollen Vordere Gasse
- 8.2 Gaby Rauch: Parkplätze KG Regenbogen in der Danziger Straße
- 8.3 Gaby Rauch: Rückbau eines Radweges und Sanierung Fuß- u. Radweg beim KG St. Vitus
- 8.4 Robert Goth: Brücke Richtung Rauenzell Abzweigung nach Hohenberg
- 8.5 Robert Goth: Aufbringung Asphaltierungsschicht Veldener Straße
- 8.6 Matthias Rank: Kommunale Wärmeplanung
- 8.7 Matthias Rank: Anschlussleitungen im neuen Baugebiet
- 8.8 Franziska Wurzinger: Haltestreifen Schüllerkreisel zum WZ Schüller
- 8.9 Franziska Wurzinger: Querungshilfe Münchener Straße

Öffentliche Sitzung vom 14.11.2023

1. Begrüßung

Sachverhalt:

Erste Bürgermeisterin Dorina Jechnerer begrüßt die Mitglieder des Bau- und Verkehrsausschusses, Herrn Lechler, Herrn Leichs sowie 5 Zuhörer. Sie stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 17.10.2023

Sachverhalt:

Das Protokoll der öffentlichen Sitzung vom 17.10.2023 wurde ordnungsgemäß zugesandt. Nachdem bis zum Ende der Sitzung keine Einwendungen erhoben wurden, ist das Protokoll genehmigt.

Abstimmungsergebnis: 8 : 0

3. Ergebnisse der Verkehrsschau

Sachverhalt:

Am 19. Oktober 2023 fand eine Verkehrsschau statt. Die Ergebnisse werden in der Sitzung vorgestellt. Das Protokoll der Verkehrsschau ist im RIS eingestellt. Polizeihauptkommissar Heinz Lechler wird in der Sitzung Fragen des Gremiums beantworten.

Nachfolgende Themen wurden aufgrund der Zuständigkeit an das Landratsamt weitergeleitet:

Ort	Ziel
Ortsausgang Herrieden Richtung Rauenzell, Parkhaus bei Möbelwerk Schüller	Versetzung des Ortsschildes Richtung Rauenzell: Das Ortsschild Richtung Rauenzell soll auf die Höhe des Erdwalls versetzt werden.
Velden von Thann herkommend	Tempo 70 im Vorfeld des Ortsschildes
Ansbacher Str. (nördliche Einmündung am Martinsberg)	Zebrastreifen
Ortsausgang Herrieden Richtung Kreisverkehr Mühlbruck, Neunstetter Str.	Versetzung des Ortsschildes an den Kreisverkehr bei Mühlbruck - oder Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 vom Ortsschild bis zum Kreisverkehr Mühlbruck
Sickersdorf 3	Anbringung eines Spiegels

Eine Beratung zur Kreuzung in Stegbruck wird in einer der nächsten Sitzungen erfolgen.

Diskussionsverlauf:

- Die Beratung bzw. Beschlussfassung für die Zebrastreifen an den Kreisverkehren in Herrieden wird vertagt. Hier bedarf es eine gesonderte Beratung, damit eine einheitliche Lösung gefunden wird.
- An der Münchener Straße wird ein Tiefbord wie in der Verkehrsschau empfohlen angebracht.
- Bei der Abzweigung zum KG ST. Vitus soll noch geprüft werden, ob eine rote Markierung aufgebracht werden kann.
- In der Fronveststraße werden in der nächsten Verkehrsschau Halbparkplätze geprüft.

Beschluss

Der BV-Ausschuss folgt den Empfehlungen der Verkehrsschau.

Für die Installation der Zebrastreifen/Ampel sollen die erforderlichen Mittel im Haushalt vorgesehen werden.

Für die Empfehlungen, die Alternativen vorsehen, fasst der BV-Ausschuss folgende Beschlüsse:

- a. Für die Kreuzung in Roth am FFW-Haus soll die bisherige Vorfahrtsregelung beibehalten werden.
- b. Für die Kreuzung in Limbach soll kein Verkehrszeichen „rechts vor links“ angebracht werden, es soll Vorfahrt achten gelten.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

4. Außenbesichtigung

5. Bekanntgaben

5.1 Sachstandsbericht der Baumaßnahmen

Sachverhalt:

Stadtschloss:

- Neuer Antrieb für Behinderten WC beauftragt
- Montage Türantrieb durch Fa. 20.11.2023

Kita Elbersroth

Kita Neunstetten - ehem. SVE-Gebäude

FFW Rauenzell – Anbau Fahrzeuggasse

- Ortstermin Fa. Heinen – Toraufmaß
- Ortstermin Fa. Michel Asphalt – Flachdachaufmaß
- Ortstermin Fa. MFH&Montage – Geländeraufmaß

- Vollwärmeschutz wurde durch FFW Rauenzell angebracht
- Flachdach wurde mit einer Schweißbahn durch Fa. Michel abgedichtet
- Treppe für 2. Rettungsweg wurde durch FFW Rauenzell montiert
- Flachdachabdichtung fertig gestellt
- Montagetermin für Türen und Fenster am 23.11.2023
- Angebote für Attikaabdeckung werden eingeholt
- Angebote für Elektroinstallation werden eingeholt

FFW Hohenberg - Neubau Feuerwehrhaus

- Vor Ort Termin mit Planungsbüros
- Abstimmung bezüglich Standort mit dem Landratsamt
- Abstimmungen Zufahrt, Erschließung, Entwässerung, Umverlegung Wasserleitung

Instandhaltung / Optimierung des Nahwärmenetzes am Schulzentrum / Biomasseheizwerk

- Vorbereitungen Umbau Gaskessel
- Erneuerung Verschleißteile an der Hackschnitzelzuführung
- Lieferung Gaskessel KW47

Buswartehallen und Fahrradüberdachung

- Maßnahme abgeschlossen

Buswartehalle Schönauf und Sickersdorf

- Buswartehallen an Fa. Distler und Sorg Bau beauftragt.
- Anfang November Baubeginn durch Fa. Sorg.
- Buswartehäuschen Fa. Distler fertiggestellt und werden nach Fertigstellung der Fundamente aufgestellt.

Freibad / Hallenbad

- Einwinterung aller Anlagen – Zusätzlicher Schutz für Kinderbecken durch Bauhof
- Prüfung einer Chlorgasleitung vom Freibad zum Hallenbad

Neubau Sporthalle

- Förderantrag gestellt
- Honoraranfragen für VgV Verfahren
- Honorar VgV Vergeben – Warten auf Aussage Regierung bezüglich Förderung

Brückengeländer 2023

- Brückengeländer werden diese Woche montiert.

- Brückengeländer 2023 abgeschlossen

Markierungsarbeiten 2023

- Angebot eingeholt
- Markierungsarbeiten an die Firma HIMA vergeben
- Ausführungszeitraum Oktober 2023
- Memelweg und Münchener Straße wegen Gehwegpflaster nicht markiert
- Fehlende Markierung (Einfahrt Dombühler Straße, Piktogramm Radweg Rauenzell) werden noch angebracht.

Spielplatz Böckau

- Maßnahme abgeschlossen
- Einweihung Spielplatz 05.12.2023 15Uhr

Straßenbauarbeiten Stadt Herrieden 2022

Asphaltierungsarbeiten (Deckschicht Schrotfeld 15.3, Rauenzell und Schernberg)

- Rauenzell „Am Weidenweg“ im Zuge der Asphaltarbeiten Baugebiet Rauenzell Mitte
- Rauenzell „Am Weidenweg“ Deckschicht nach Anschlussarbeiten Breitband Hs. Nr. 20 (Anschluss nach digitaler Einmessung nicht vorhanden, Fa. Omexom im Auftrag Fa. Thannhauser verlegt, Wendehammer muss nochmals geöffnet werden, Kosten Fa. Omexom)

Straßenausbauprogramm (Vollausbauten) 2023 HHSt.: 6300.9412

Teilsanierung Königsberger Straße

- Straßenbaumaßnahme ohne Deckschicht durchgeführt.
- Deckschicht 20.09 und 21.09.2023
- Zufahrt zum Grundstück von Frau Blank „Zur Schwedenschanz 14“ wird im Zuge der Deckschichtarbeiten Königsberger Straße mit asphaltiert
- Maßnahme abgeschlossen

Straßensanierungsprogramm 2023 HHSt.: 6300.9411

- Auftrag an Fa. Thannhauser vergeben.
- Geplante Ausführung ab ca. Mitte Oktober
- Maßnahme wird durchgeführt.
- Restarbeiten KW 42 (diese Woche)
- Oberflächenbehandlung (Spritzdecke) Durchführung Frühjahr 2024
- Beauftragung war zu kurzfristig, da die Arbeiten für Oberflächenbehandlungen Ende September eingestellt werden. Fa. Geuder hat die Auftragssumme für Frühjahr 2024 bestätigt.

- Straßensanierungsmaßnahmen Fa. Thannhauser abgeschlossen.

Erschließung Nr. 7 Rauenzell Mitte

- Asphalt- und Pflasterarbeiten fertiggestellt
- Vermessung durchgeführt
- Restarbeiten KW 42 und 43
- Restarbeiten bis spätestens KW 47 (letzte Frist gesetzt)
- Abnahme soll bis Ende KW 47 erfolgen

Erschließung BG Schrotfeld 15.4

- Kanalarbeiten durch Fa. Neureiter aus Fremdingen werden durchgeführt.
- Kanalbauarbeiten BA 1+2 größtenteils abgeschlossen
- Verlegung Wasserleitung Fa. Neureiter bis Mitte November
- Beginn Baumaßnahme Abbiegespur ab KW 43 (24.10.2023)
- Nach Fertigstellung Mitte November Beginn Verlegung Strom, Telekom und Vodafone
- Anschließend Straßenbauarbeiten
- Fa. Thannhauser hat mit der Abbiegespur Hohenberger Straße begonnen
- Wasserleitung wird im 1 BA verlegt.

Erschließung BG Halmons-lache Neunstetten

Erschließung BG Heuberg

- Auftragserteilung nach Beschluss BV-Ausschuss und Stadtrat.
- Geplanter Baubeginn Oktober 2023
- Fester Termin steht noch nicht fest,
- Baubeginn Frühjahr 2024

KidZ Lebenshilfe

- Erste Planungsbesprechung mit den Beteiligten in KW37
- Abstimmungen bezüglich Förderanträgen mit Lebenshilfe und Regierung
- Interne Planungsabstimmungen Lebenshilfe
- Kostenüberarbeitung Haustechnik

Radweg Lammelbach – Lettenmühle

- Spatenstich 29.09.2023
- Baubeginn Lettenmühle – Lammelbach noch nicht bekannt.

Radweg Rauenzell – Burgoberbach

- Gemeinderatsbeschluss Burgoberbach im Juli 2023

- Konkretisierte Abstimmung mit den Staatsforsten durch die Stadt Herrieden und das Ingenieur-Büro Heller im August/September 2023
- Zustimmung zur Trasse durch Staatsforsten und Zusage, dass die benötigte Fläche einschließlich Sicherheitsstreifen vom Staatsforst zur Verfügung gestellt wird
-
- Nächste Schritte:
- Stellen eines Förderantrags zum Bau des Radweges in Sonderbaulast inkl. Regelung, dass die Straßenbauverwaltung die Baulast übernimmt und den Baugrund in ihr Eigentum übernimmt. Die Stadt tritt somit im Bereich des Staatswaldes nicht als Grunderwerber auf.
- Grundstücksverhandlungen mit privaten Grundstücksbesitzern
- Wenn Naturschutzrechtlich nichts dagegenspricht und die Staatsforsten dies in ihren Planungen noch berücksichtigen können, werden die Rodungsarbeiten noch im Winter 23/24 begonnen werden.
- Maßnahmenbeginn nach Erhalt des Förderbescheides-Rodungen im Winter 2024/2025.

5.2 **Zusätzlicher Durchlass Kr AN 37 Sickersdorf**

Sachverhalt:

In der nichtöffentlichen BV-Ausschusssitzung am 17.10.2023 hat der BV-Ausschuss die Vergabe für einen zusätzlichen Durchlass an der Kr AN 37 Sickersdorf an die Firma Ulsenheimer Bau aus Lichtenau beschlossen.

5.3 **Vorstellung Bestands-, Schadens- und Sanierungsgutachten Vordere Gasse 13**

Sachverhalt:

Herr Farzad Alizadeh vom Arch.-Büro Farzad Alizadeh, Dinkelsbühl, stellt in der Sitzung die Ergebnisse aus dem Bestands-, Schadens- und Sanierungsgutachten für die Vordere Gasse 13 vor.



5.4 Hofzufahrt der Firma Hammerbacher über städtischen Gehweg in Steinbach.

Sachverhalt:

Herr Hammerbacher wendet sich an die Stadt Herrieden und möchte, dass die Straße und die geteerte Teilfläche die an seine Hoffläche angrenzt, angehoben wird, damit es die gleiche Höhe ergibt. Der BV-Ausschuss schaut sich die Situation anhand von Bildern an. Die Verwaltung erklärt den momentanen Sachstand. Der BV-Ausschuss und die Verwaltung sehen aktuell keinen Handlungsbedarf von Seiten der Stadt.

6. Bauanträge

6.1 Tekturplan für Errichtung eines Erdwalls

Sachverhalt:

Tekturantrag für die Errichtung eines Erdwalls der Firma Schüller Möbelwerk KG auf Flst. 764/2, Gemarkung Herrieden, Rother Straße 1.

Nachdem der Wall abgerutscht ist, ist eine Umgestaltung in manchen Bereichen erforderlich. Die bisherige Höhe wird nicht überschritten. Die Basis des Walls wird an manchen Stellen verbreitert und an Engstellen so gestaltet, dass der Rettungsweg für die FFW verbessert wird.



Rechtliche Würdigung:

Die Baumaßnahme befindet sich innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 19 „Rother Straße“.

Beschluss

Der BV-Ausschuss beschließt, dass der Tagesordnungspunkt bis zur nächsten BV-Sitzung vertagt wird.


Abstimmungsergebnis:

9 : 0

6.2 Einbau Bühne bei Halle 8.0

Sachverhalt:

Bauantrag für den Einbau einer Bühne (Rückwandfertigung) bei Halle 8.0 der Firma Schüller, Möbelwerk KG auf Flst. 731/1, Gemarkung Herrieden, Rother Straße 1.

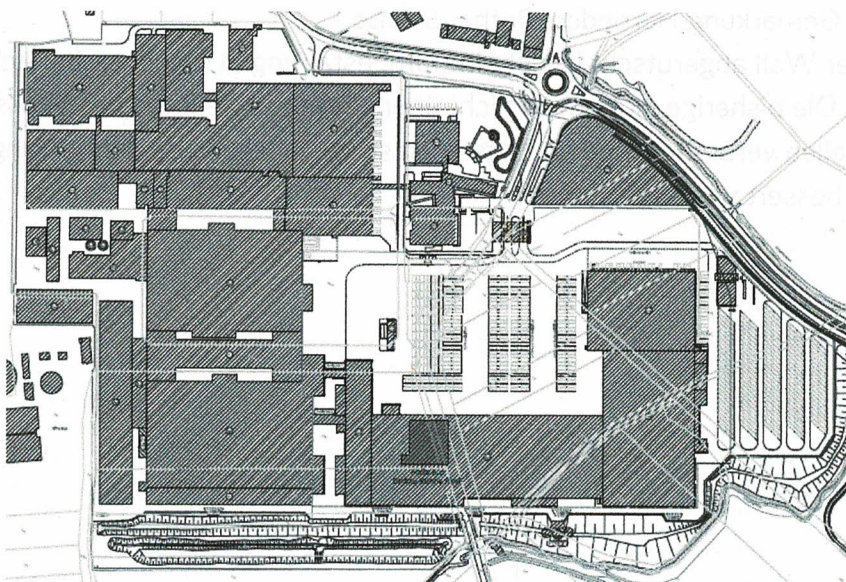

Beschluss


Der BV-Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat die gemeindliche Einvernahme zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

6.3 Antrag auf Vorbescheid für die Neuerrichtung eines FFW-Hauses OT Hohenberg

Sachverhalt:

Antrag auf Vorbescheid für die Neuerrichtung eines FFW-Hauses im OT Hohenberg der Stadt Herrieden auf Flst. 93/1, Gemarkung Hohenberg.

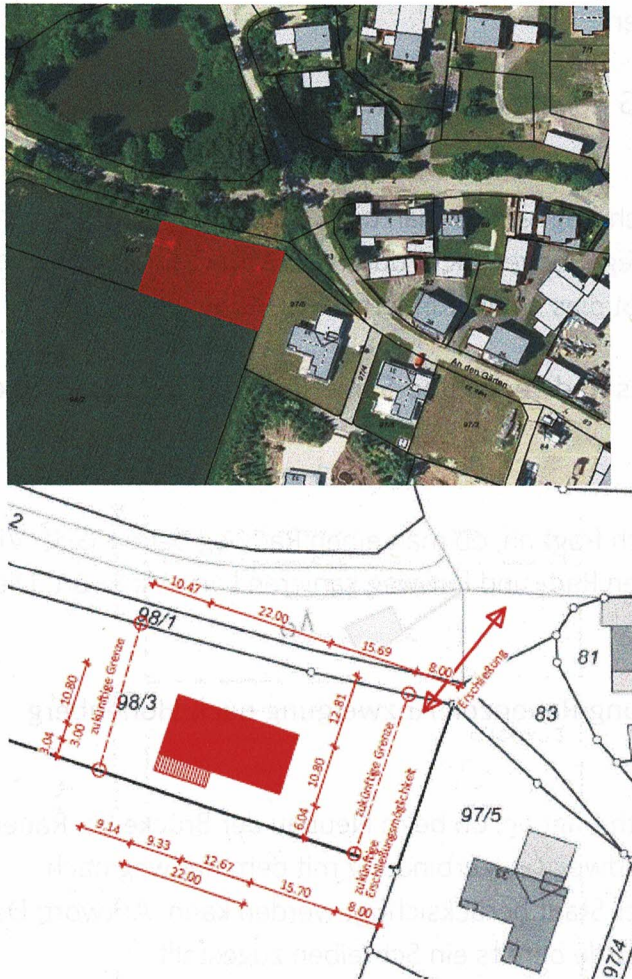

Rechtliche Würdigung:

Das vorgesehene Baugrundstück liegt innerhalb der Flächennutzungsplanabgrenzung der derzeitigen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, direkt angrenzend an die vorhandene Bebauung des Ortsteils Hohenberg. Das Vorhaben ist nach Aussage der Unteren Bauaufsichtsbehörde LRA Ansbach gemäß § 34 BauGB genehmigungsfähig.

Beschluss

Der BV-Ausschuss erteilt die gemeindliche Einvernahme für die Neuerrichtung eines FFW-Hauses im OT Hohenberg. Wenn der Vorbescheid positiv beschieden wird, wird die Verwaltung beauftragt, auf dieser Basis den Bauantrag beim LRA einzureichen.

Abstimmungsergebnis: 9 : 0

7. Antworten zu den eingereichten Bürgeranfragen

Sachverhalt:

Es liegen keine Bürgeranfragen vor.

8. Anfragen

8.1 Gaby Rauch: Geschwindigkeitskontrollen Vordere Gasse

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Gaby Rauch fragt an, ob man in der Vordere Gasse Geschwindigkeitskontrollen veranlassen kann. Antwort: Die Verwaltung gibt dies an die Verkehrsüberwachung weiter.

8.2 Gaby Rauch: Parkplätze KG Regenbogen in der Danziger Straße

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Gaby Rauch fragt an, ob man die Kita-Leitung darum bitten kann, die Parkplätze am KG Unterm Regenbogen nicht durch die Mitarbeitenden zu belegen. Antwort: Die Verwaltung gibt dies an die Kindergartenleitung weiter.

8.3 Gaby Rauch: Rückbau eines Radweges und Sanierung Fuß- u. Radweg beim KG St. Vitus

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Gaby Rauch fragt an, ob man einen Radweg beim KG St. Vitus zurückbauen und den anderen Rad- und Fußweg sanieren kann. Antwort: Dies wird in die Liste aufgenommen.

8.4 Robert Goth: Brücke Richtung Rauenzell Abzweigung nach Höhenberg

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Robert Goth fragt an, ob beim Neubau der Brücke bei Rauenzell die Errichtung eines Fuß- und Radweg (in Verbindung mit dem Radweg nach Burgoberbach) von Seiten der Stadt berücksichtigt werden kann. Antwort: Dem Staatliche Straßenbauamt wurde bereits ein Schreiben zugestellt.

8.5 Robert Goth: Aufbringung Asphaltierungsschicht Veldener Straße

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Robert Goth fragt an, ob man nicht auf der Straße zu den Neubauten „Schmidt“ und „Dick“ die Straße eine Asphaltsschicht aufbringen kann. Antwort: Die Verwaltung nimmt die Anfrage zu Protokoll.

8.6 Matthias Rank: Kommunale Wärmeplanung

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Matthias Rank fragt an, ob man im Rahmen der Nahwärmenetzplanung die Eigentümer der vorherigen Schrottfeldbaugebieten anschreiben kann. Antwort: Aktuell wartet die Stadt auf eine Antwort zum Förderantrag für die Wärmeplanung.

8.7 Matthias Rank: Anschlussleitungen im neuen Baugebiet

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Matthias Rank fragt an, wer die Anschlussleitungen in den neuen Bauplätzen vorgibt, bzw. ob diese ausreichend dimensioniert sind.

8.8 Franziska Wurzinger: Haltestreifen Schüllerkreisel zum WZ Schüller

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Franziska Wurzinger fragt an, ob man in der Industriestraße zwischen den beiden Kreisverkehren einen Radstreifen in Nord-Süd-Richtung ausweisen kann. Es ist zu prüfen, ob die Breite ausreicht.

8.9 Franziska Wurzinger: Querungshilfe Münchener Straße

Sachverhalt:

Stadtratsmitglied Franziska Wurzinger fragt an, ob die Errichtung einer Querungshilfe in der Großenrieder Straße auf Höhe des Fußweges zum Stadtschloss geprüft werden kann.



Dorina Jechnerer
Erste Bürgermeisterin



Michaela Bernhard
Schriftführerin

